DANFO (UK) LTD

Project Name	Wellington Town Council	Programme Prepared By	ASD	Date Prepared	11/07/2025

Week Commencing	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025
Project Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	17

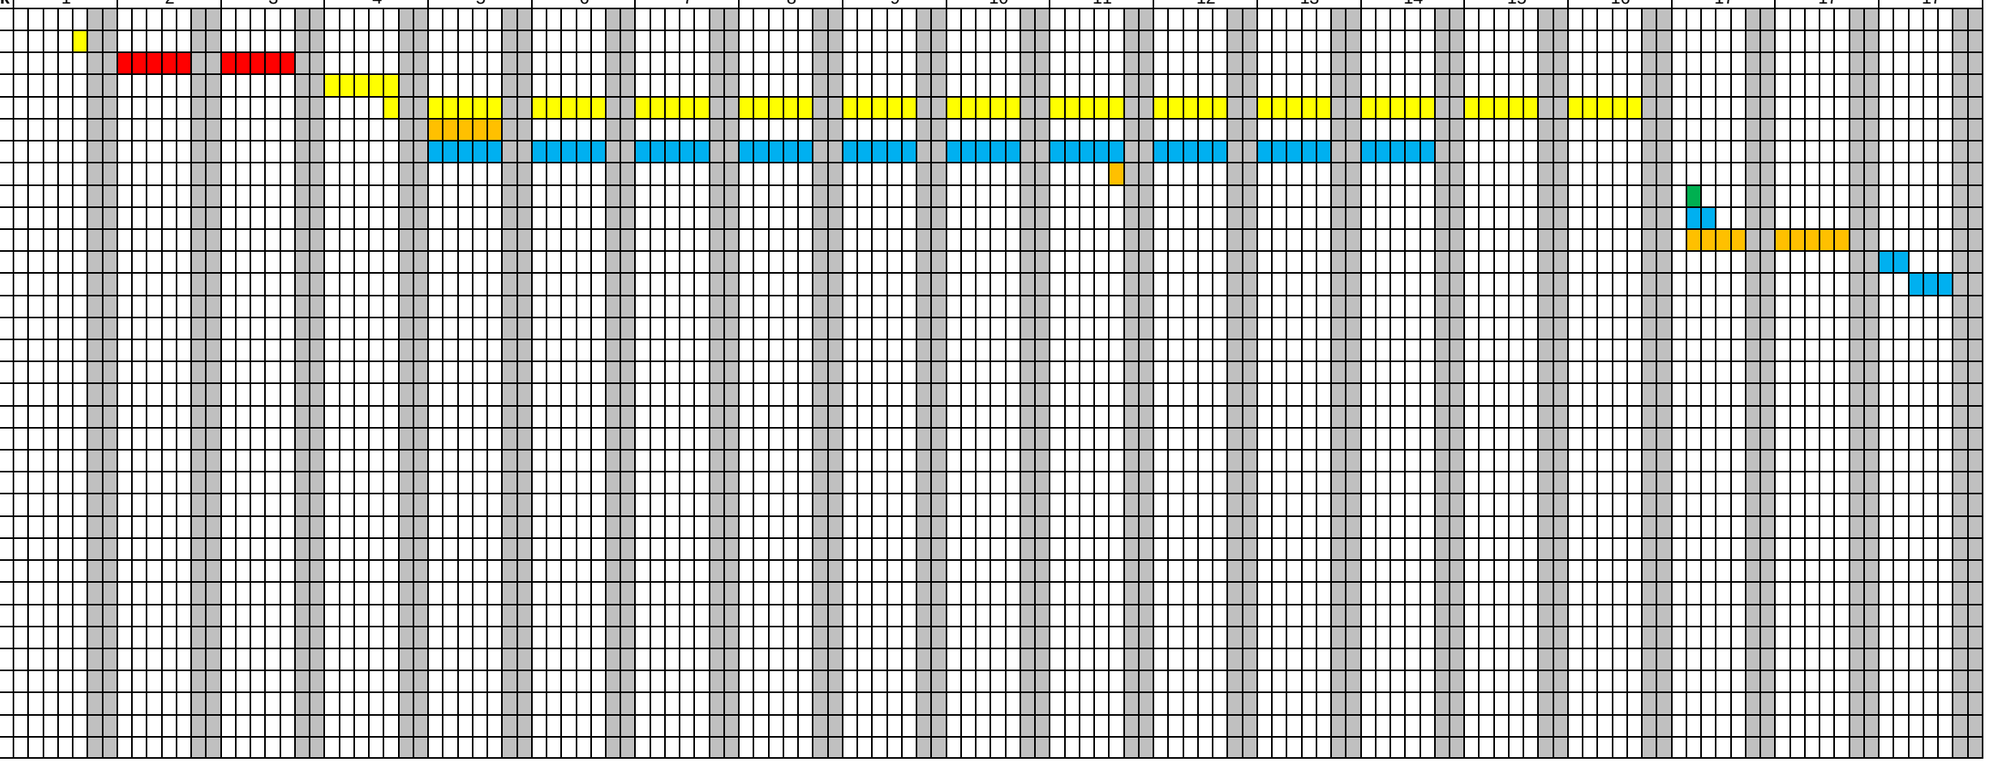

Return Tender	
Contract award ESTIMATE	
Agree exact specification	
Apply TTRO upto 12 weeks inc traffic management plan	
Liaise with Principle Contractor	
Manufactue modular building	
Site visit with Principle Contractor ESTIMATE	
Deliver Modular Toilet	
Connect incoming services	
Principle Contractor complete reinstatement ESTIMATE	
Commision toilet and handover	
Complete O&M H&S file certification etc	
